

Area Poliziano - Fase 1° - durata 4 gg. 07-10/03/22
 Realizzazione Attraversamento lato Controviale
 Area occupazione = 275 m²

Nuovo tratto DN300 da realizzare in 1° fase

Manufatti già realizzati

Nuovo tratto DN300 da realizzare nella 2° fase

2 Corsie aperte verso Viale Strozzi

NODO 3

Ingresso temporaneo al controviale

P.C.



COMUNE DI FIRENZE

Publiacqua

**LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA
 VIALE LAVAGNINI VIALE MATTEOTTI - FIRENZE**


TAVOLA	TITOLO: CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA FASE DI CANTIERIZZAZIONE Attraversamento Area Via Poliziano - Fase 1°	Scala:
INGEGNERIE TOSCANE <small>Sede Firenze - Via De' Sordani, 49/51 - 50136 - Cof.Fisc. e P.I.V.A. 0611905088 Organizzazione con Sistema di Gestione Integrato Certificato in conformità alle normative ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 - SA 8000</small>		
CAPO PROGETTO:	COLLABORATORE:	
COMMESSA IT:		
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Agostino Francesco Chiarillo	RESPONSABILE COMMITTENTE: Ing. Cristiano Agostini	
DIRETTORE TECNICO PROGETTI E MANUTENZIONI INGEGNERIE TOSCANE: Ing. Giovanni Simonelli	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Massimo Nebbiai	
REV.	DATA	DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONE
		REDDATO
		CONTROLLATO / APPROVATO

Proprietà riservata. Vietata la riproduzione e la diffusione.

LEGENDA

Viabilità ordinaria	Area di lavoro
Viabilità ordinaria in fase di cantiere	Area di sosta consentita ai soli cicli e motocicli
New Jersey di delimitazione	Ricostruzione con rete
Segnaletica orizzontale in fase di cantiere	
Segnaletica verticale in fase di cantiere	

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno riallocati provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti

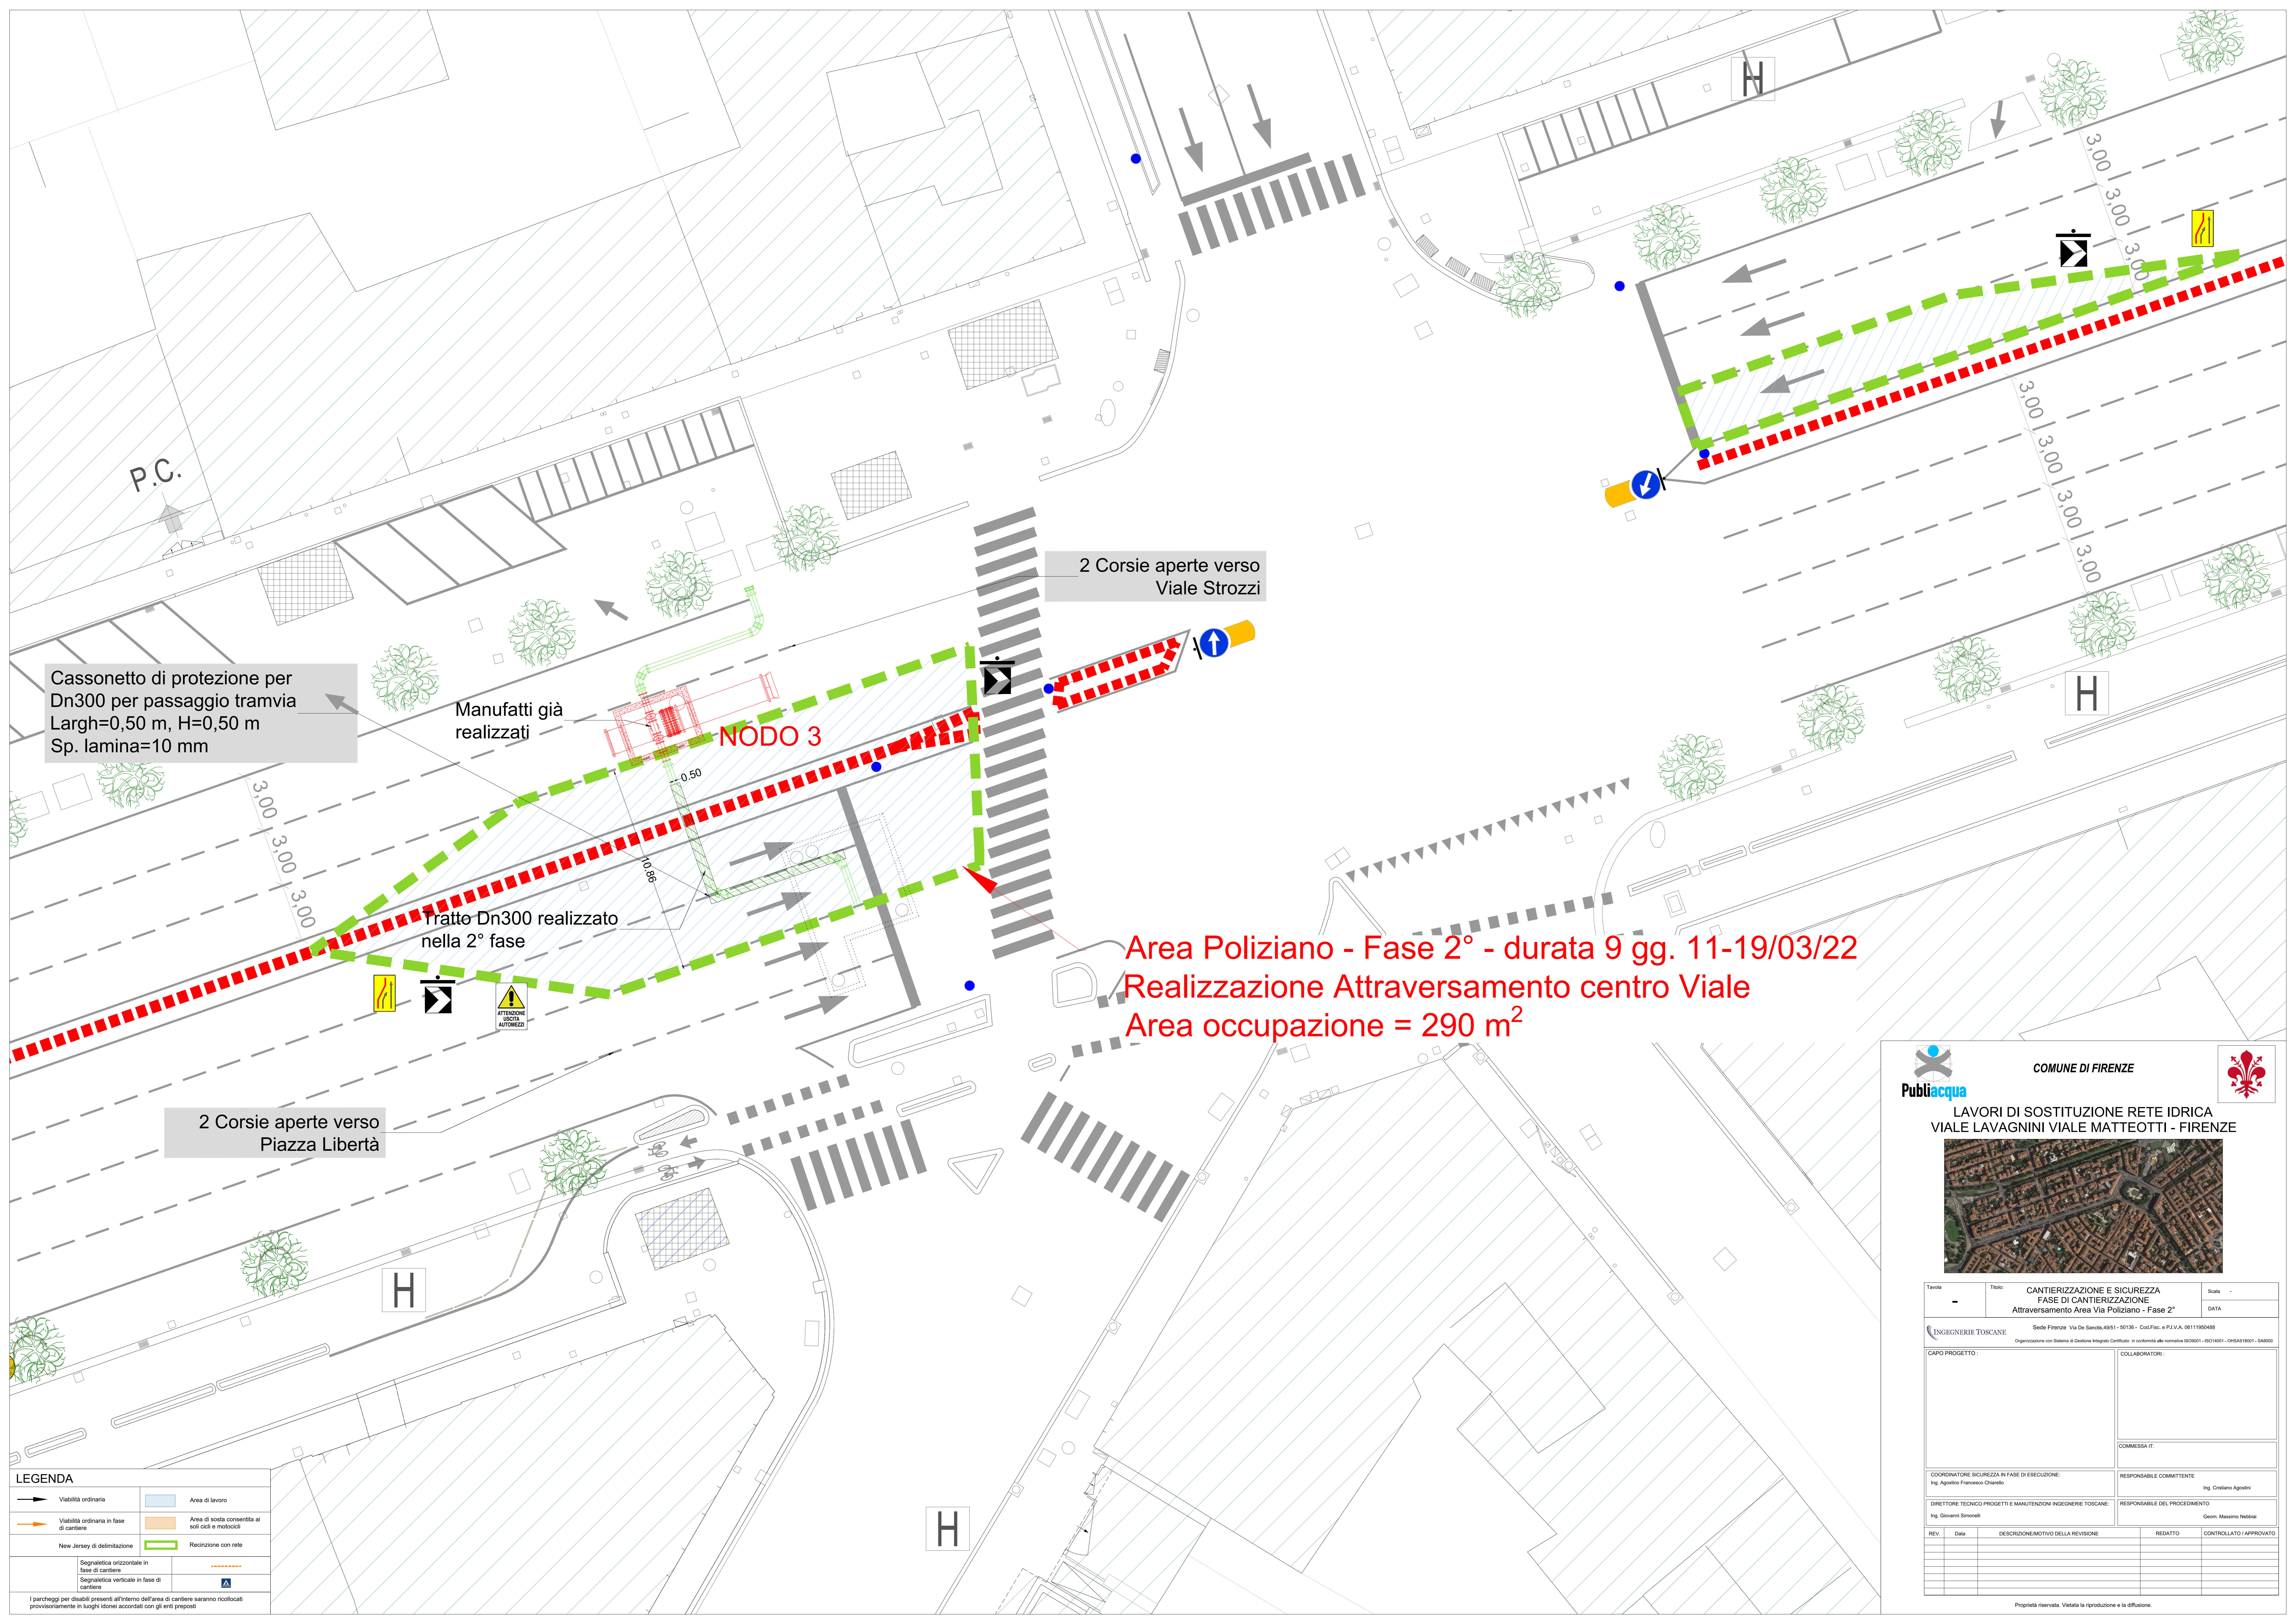

Cassonetto di protezione per Dn300 per passaggio tramvia
Largh=0,50 m, H=0,50 m
Sp. lamina=10 mm

Manufatti già realizzati

NODO 3

Tratto Dn300 realizzato nella 2° fase

2 Corsie aperte verso Viale Strozzi

Area Poliziano - Fase 2° - durata 9 gg. 11-19/03/22
Realizzazione Attraversamento centro Viale
Area occupazione = 290 m²

2 Corsie aperte verso Piazza Libertà

LEGENDA

	Visibilità ordinaria		Area di lavoro
	Visibilità ordinaria in fase di cantiere		Area di sosta consentita ai soli cicli e motocicli
	New Jersey di delimitazione		Ricostruzione con rete
	Segnaletica orizzontale in fase di cantiere		
	Segnaletica verticale in fase di cantiere		

I parcheggi per disabili presenti all'interno dell'area di cantiere saranno riallocati provvisoriamente in luoghi idonei accordati con gli enti preposti



COMUNE DI FIRENZE



**LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA
VIALE LAVAGNINI VIALE MATTEOTTI - FIRENZE**



Tavola	TITOLO: CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA FASE DI CANTIERIZZAZIONE Attraversamento Area Via Poliziano - Fase 2°	Scala
		DATA
Sede Firenze - Via De Sanctis, 49/51 - 50136 - Cof.Fisc. e P.I.V.A. 0611950988		
INGEGNERIE TOSCANE Organizzazione con Sistema di Gestione Integrato Certificato in conformità alle normative ISO9001 - ISO14001 - UNI EN ISO 45001 - SA8000		
CAPO PROGETTO:	COLLABORATORE:	
COMMESSA IT:		
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Ing. Agostino Francesco Chianello	RESPONSABILE COMMITTENTE: Ing. Cristiano Agostini	
DIRETTORE TECNICO PROGETTI E MANUTENZIONI INGEGNERIE TOSCANE: Ing. Giovanni Simonelli	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Massimo Nebbiai	
REV.	DATA	DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONE
		REDDATO
		CONTROLLATO / APPROVATO

Proprietà riservata. Vietata la riproduzione e la diffusione.
